GANTT TEÓRICO - PROYECTO COMPLETO

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	Obrador	4 days?	Wed 24/08/11	Mon 29/08/11	
2	Replanteo estructura	2 days	Mon 29/08/11	Tue 30/08/11	
3	Excavación Pozos y cabezales 1	8 days	Wed 31/08/11	Fri 09/09/11	2
4	Excavación Pozos y cabezales 2	5 days	Mon 12/09/11	Fri 16/09/11	3
5	Excavación Pozos y cabezales 3	6 days?	Mon 19/09/11	Mon 26/09/11	4
6	Excavación de riostras 1	5 days?	Mon 05/09/11	Fri 09/09/11	2
7	Excavación de riostras 2	7 days	Mon 12/09/11	Tue 20/09/11	6
8	Excavación de riostras 3	7 days	Wed 21/09/11	Thu 29/09/11	7
9	Llenado 1	1 day?	Mon 12/09/11	Mon 12/09/11	3;6
10	Llenado 2	1 day?	Wed 21/09/11	Wed 21/09/11	4;7
11	Llenado 3	1 day?	Fri 30/09/11	Fri 30/09/11	5;8
12	Armado columnas PB	7 days	Mon 03/10/11	Tue 11/10/11	11
13	Armado losa sobre PB	7 days	Wed 12/10/11	Thu 20/10/11	12
14	Llenado losa sobre PB	1 day?	Fri 21/10/11	Fri 21/10/11	13
15	Armado columnas 1º	7 days	Mon 24/10/11	Tue 01/11/11	14
16	Armado losa sobre 1º	7 days	Wed 02/11/11	Thu 10/11/11	15
17	Llenado losa sobre 1º	1 day?	Fri 11/11/11	Fri 11/11/11	16
18	Armado columnas 2º	6 days	Mon 14/11/11	Mon 21/11/11	17
19	Armado losa sobre 2º	6 days	Tue 22/11/11	Tue 29/11/11	18
20	Llenado losa sobre 2º	1 day?	Wed 30/11/11	Wed 30/11/11	19
21	Armado columnas Tanque	3 days	Thu 01/12/11	Mon 05/12/11	20
22	Armado losa sobre Tanque	3 days	Tue 06/12/11	Thu 08/12/11	21
23	Llenado losa sobre Tanque	1 day?	Fri 09/12/11	Fri 09/12/11	22
24	Ladrillo visto PB	10 days	Mon 09/01/12	Fri 20/01/12	
25	Ladrillo cerámico PB	37 days	Mon 23/01/12	Fri 23/03/12	24
26	Grueso PB	15 days?	Mon 26/03/12	Fri 13/04/12	
27	Contrapiso PB	20 days?	Mon 19/03/12	Fri 13/04/12	
28	Colocación de marcos PB	18 days?	Wed 21/03/12	Fri 13/04/12	
29	Ladrillo visto 1º piso	10 days	Mon 23/01/12	Fri 03/02/12	24
30	Ladrillo cerámico 1º piso	15 days?	Mon 06/02/12	Fri 24/02/12	29
31	Grueso 1º piso	35 days?	Mon 27/02/12	Fri 13/04/12	
32	Colocación de marcos 1º piso	10 days?	Mon 12/03/12	Fri 23/03/12	30
33	Fino en cocinas 1º piso	10 days?	Mon 30/04/12	Fri 11/05/12	
34	Carpetas 1º piso	15 days?	Mon 14/05/12	Fri 01/06/12	32
35	Ladrillo visto 2º piso	10 days	Mon 06/02/12	Fri 17/02/12	29
36	Ladrillo cerámico 2º piso	13 days?	Wed 22/02/12	Fri 09/03/12	35
37	Grueso 2º piso	30 days?	Mon 05/03/12	Fri 13/04/12	
38	Colocación de marcos 2º piso	10 days?	Mon 26/03/12	Fri 06/04/12	36
39	Fino en cocinas 2º piso	10 days?	Mon 30/04/12	Fri 11/05/12	
40	Carpetas 2º piso	15 days?	Mon 14/05/12	Fri 01/06/12	38
41	Ladrillo visto Tanque	5 days	Mon 20/02/12	Fri 24/02/12	35
42	Ladrillo visto patio interno	10 days?	Mon 02/04/12	Fri 13/04/12	
43	Carga con pendiente en terraza	15 days?	Mon 16/04/12	Fri 04/05/12	
44	Mampostería PB y revoques	15 days?	Mon 04/06/12	Fri 22/06/12	
45	Marcos ventanas PB	5 days?	Mon 25/06/12	Fri 29/06/12	44
46	Contrapiso Local comercial	7 days?	Mon 04/06/12	Tue 12/06/12	
47	Visto Patio interno y marcos ventanas	13 days?	Mon 02/07/12	Wed 18/07/12	
48	Carpetas deptos e ingreso	15 days?	Mon 11/06/12	Fri 29/06/12	
49	Enlucido cal patios internos	8 days?	Mon 02/07/12	Wed 11/07/12	
50	Visto frente	12 days?	Mon 09/07/12	Tue 24/07/12	
51	Enlucido cal balcón frente	10 days?	Mon 23/07/12	Thu 02/08/12	
52	Colocación de cerramientos de medidores y tableros	5 days?	Sun 29/07/12	Thu 02/08/12	
53	Ladrillo cerámico ingreso, revoques y colocación de Puerta	5 days?	Sun 29/07/12	Thu 02/08/12	
54	Carpeta Local comercial	5 days?	Sun 29/07/12	Thu 02/08/12	
55	Enlucido cal patios	10 days?	Sun 29/07/12	Thu 09/08/12	
56	Remate montantes Terraza	10 days?	Mon 30/07/12	Fri 10/08/12	
57	Colocación puertas Terraza y sala de bombeo	5 days?	Mon 13/08/12	Fri 17/08/12	
58	Detalles: Rejillas de ventilación, rejillas desagu	27 days	Thu 23/08/12	Fri 28/09/12	
59	Asadores	10 days?	Mon 13/08/12	Fri 24/08/12	
60	Enlucido cal en frente	10 days?	Mon 20/08/12	Fri 31/08/12	
61	Colocación vereda	5 days?	Mon 27/08/12	Fri 31/08/12	
62	Fino balcón 2º	5 days?	Mon 02/07/12	Fri 06/07/12	
63	Carpeta cementicia terrazas	7 days?	Mon 02/07/12	Tue 10/07/12	
64	Asadores terraza	5 days?	Mon 02/07/12	Fri 06/07/12	
65	Montantes terrazas	4 days?	Mon 16/07/12	Thu 19/07/12	
66	Bañeras 2º	3 days?	Fri 20/07/12	Tue 24/07/12	
67	Bañeras 1º	5 days?	Wed 11/07/12	Tue 17/07/12	
68	Mampostería en ojo de escalera	5 days	Thu 26/07/12	Tue 31/07/12	
69	Fino balcón 1º	10 days?	Wed 11/07/12	Tue 24/07/12	
70	Ladrilo cerámico palier terraza	5 days?	Mon 30/07/12	Fri 03/08/12	
71	Ladrillo cerámico palier 2º	3 days?	Mon 30/07/12	Wed 01/08/12	
72	Ladrillo cerámico palier 1º	3 days?	Thu 02/08/12	Mon 06/08/12	
73	Limpieza ladrillo visto	20 days?	Mon 13/08/12	Fri 07/09/12	
74	Cerámico en terraza	10 days?	Mon 02/07/12	Fri 13/07/12	
75	Porcelanato 2º A	6 days?	Tue 10/07/12	Tue 17/07/12	
76	Cerámico Balcones 2º	6 days?	Tue 10/07/12	Tue 17/07/12	
77	Cerámicos de baños 2º A	5 days	Wed 18/07/12	Tue 24/07/12	
78	Porcelanato 2º B	10 days	Wed 18/07/12	Mon 30/07/12	75
79	Antepechos 1º y 2º	5 days	Wed 25/07/12	Mon 30/07/12	77
80	Cerámicos de baños 1º	7 days?	Tue 31/07/12	Wed 08/08/12	
81	Cerámicos balcón 1º A	5 days?	Tue 31/07/12	Mon 06/08/12	
82	Porcelanato 1º B	5 days?	Tue 07/08/12	Mon 13/08/12	
83	Porcelanato 1º C	4 days?	Tue 14/08/12	Fri 17/08/12	82
84	Detalles cerámicos	5 days?	Thu 09/08/12	Wed 15/08/12	
85	Cerámicos Baño PB	10 days?	Thu 16/08/12	Wed 29/08/12	
86	Cerámicos cocina PB	5 days	Thu 30/08/12	Wed 05/09/12	85
87	Cerámico escalera T - 2º	5 days?	Thu 06/09/12	Wed 12/09/12	
88	Cerámico escalera 2º - PBº	5 days?	Thu 06/09/12	Wed 12/09/12	
89	Porcelanato PB	5 days?	Thu 13/09/12	Wed 19/09/12	
90	Cerámico ingreso	3 days?	Thu 13/09/12	Mon 17/09/12	
91	Cerámico Local	3 days?	Tue 18/09/12	Thu 20/09/12	
92	Yeso 2ºB	15 days?	Mon 04/06/12	Fri 22/06/12	
93	Yeso 1º B	7 days?	Mon 04/06/12	Tue 12/06/12	
94	Yeso 1º C	8 days?	Wed 13/06/12	Fri 22/06/12	93
95	Yeso 2º A	10 days	Mon 25/06/12	Fri 06/07/12	92
96	Yeso 1º A	10 days	Mon 25/06/12	Fri 06/07/12	94
97	Yeso PB B	8 days?	Mon 09/07/12	Wed 18/07/12	
98	Yeso PB C	8 days?	Mon 09/07/12	Wed 18/07/12	
99	Yeso escalera terraza- 2º	5 days?	Mon 06/08/12	Fri 10/08/12	70
100	Yeso escalera 2º - 1º	5 days?	Mon 06/08/12	Fri 10/08/12	71
101	Yeso escalera 1º - PB	5 days?	Mon 13/08/12	Fri 17/08/12	72
102	Yeso Palier ingreso	8 days?	Mon 13/08/12	Wed 22/08/12	
103	Yeso Bajo escalera	5 days?	Mon 20/08/12	Fri 24/08/12	
104	Yeso Local comercial	7 days?	Thu 23/08/12	Fri 31/08/12	

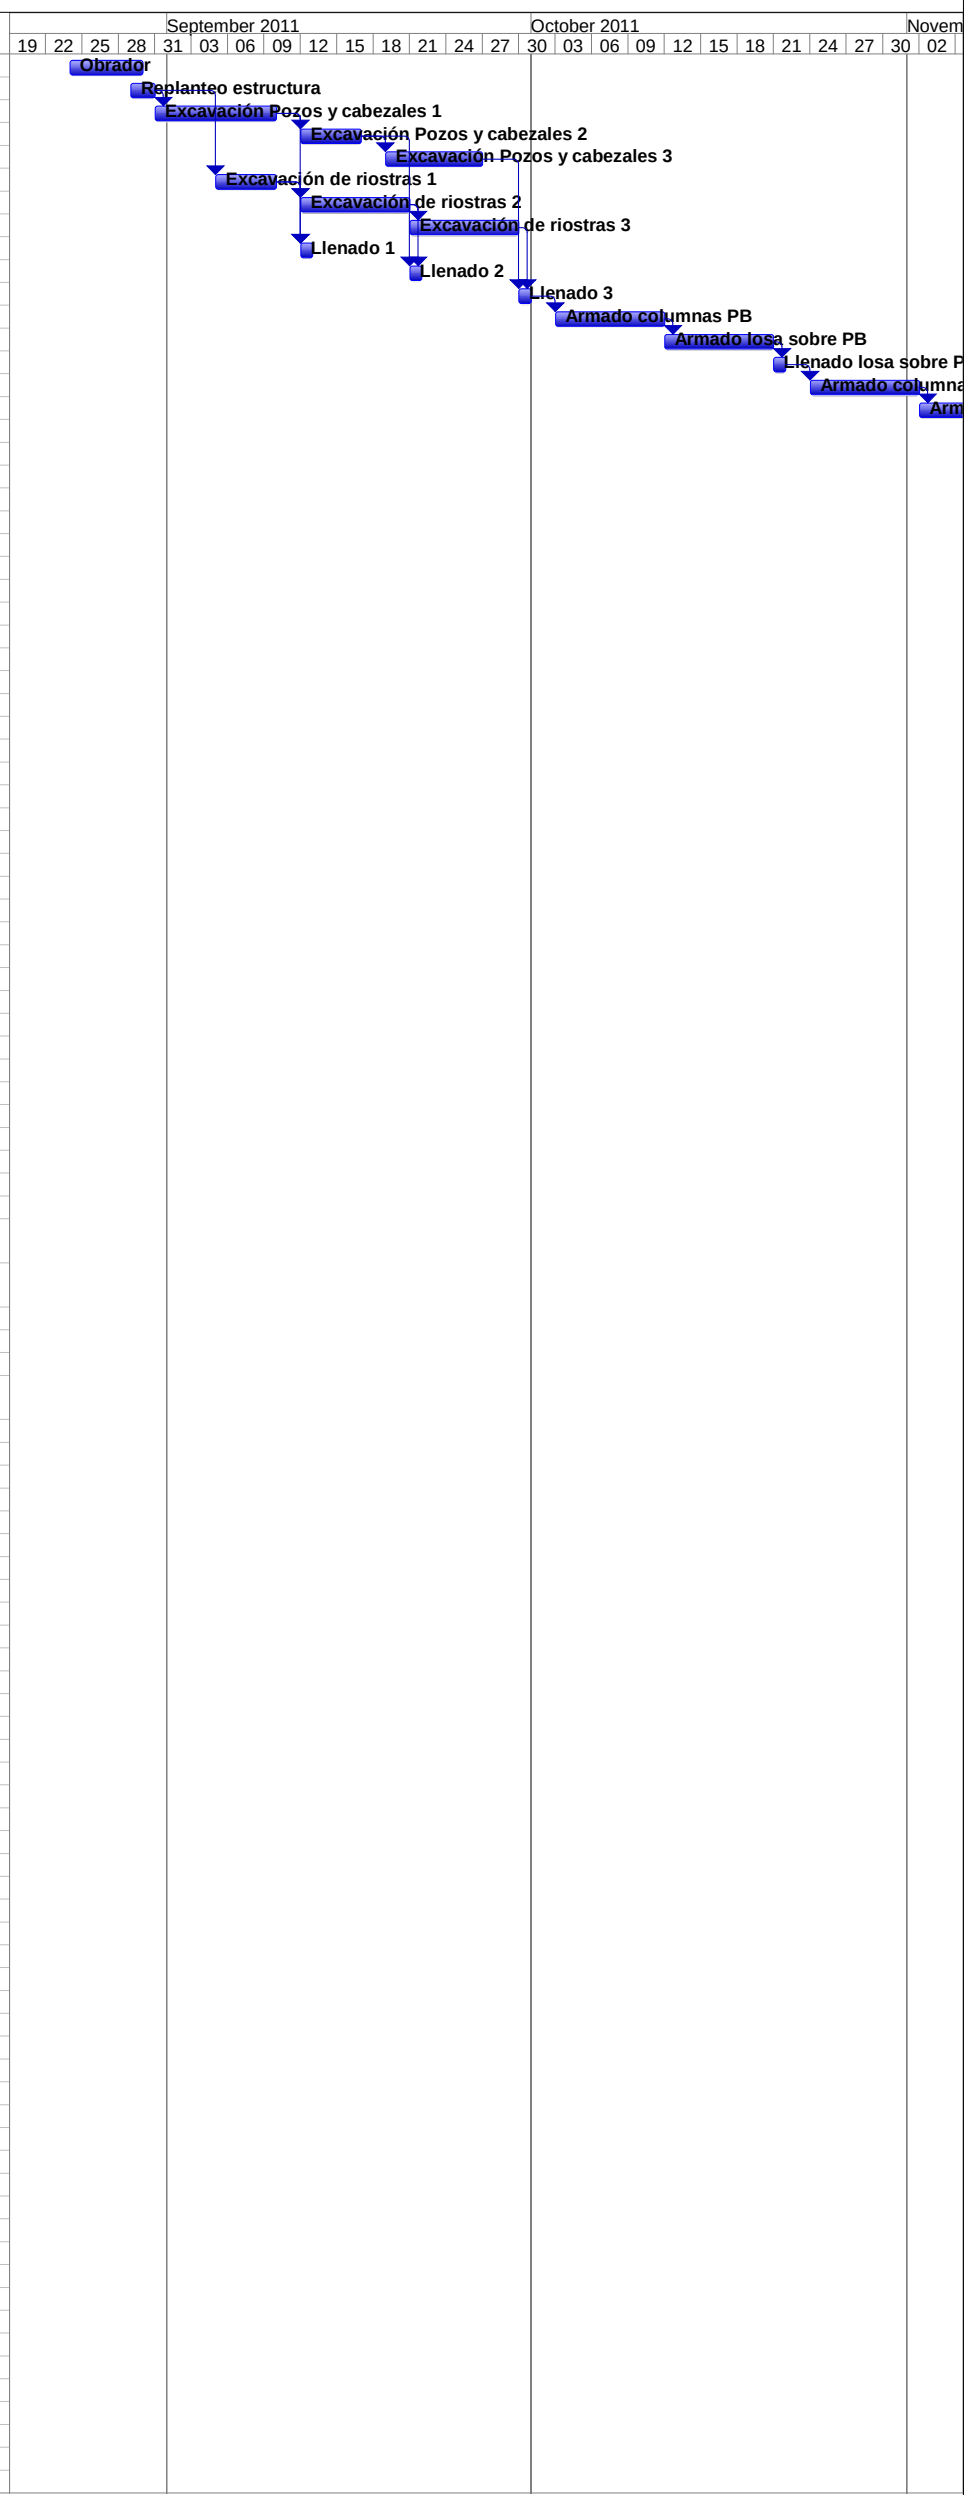

GANTT TEÓRICO - PROYECTO COMPLETO

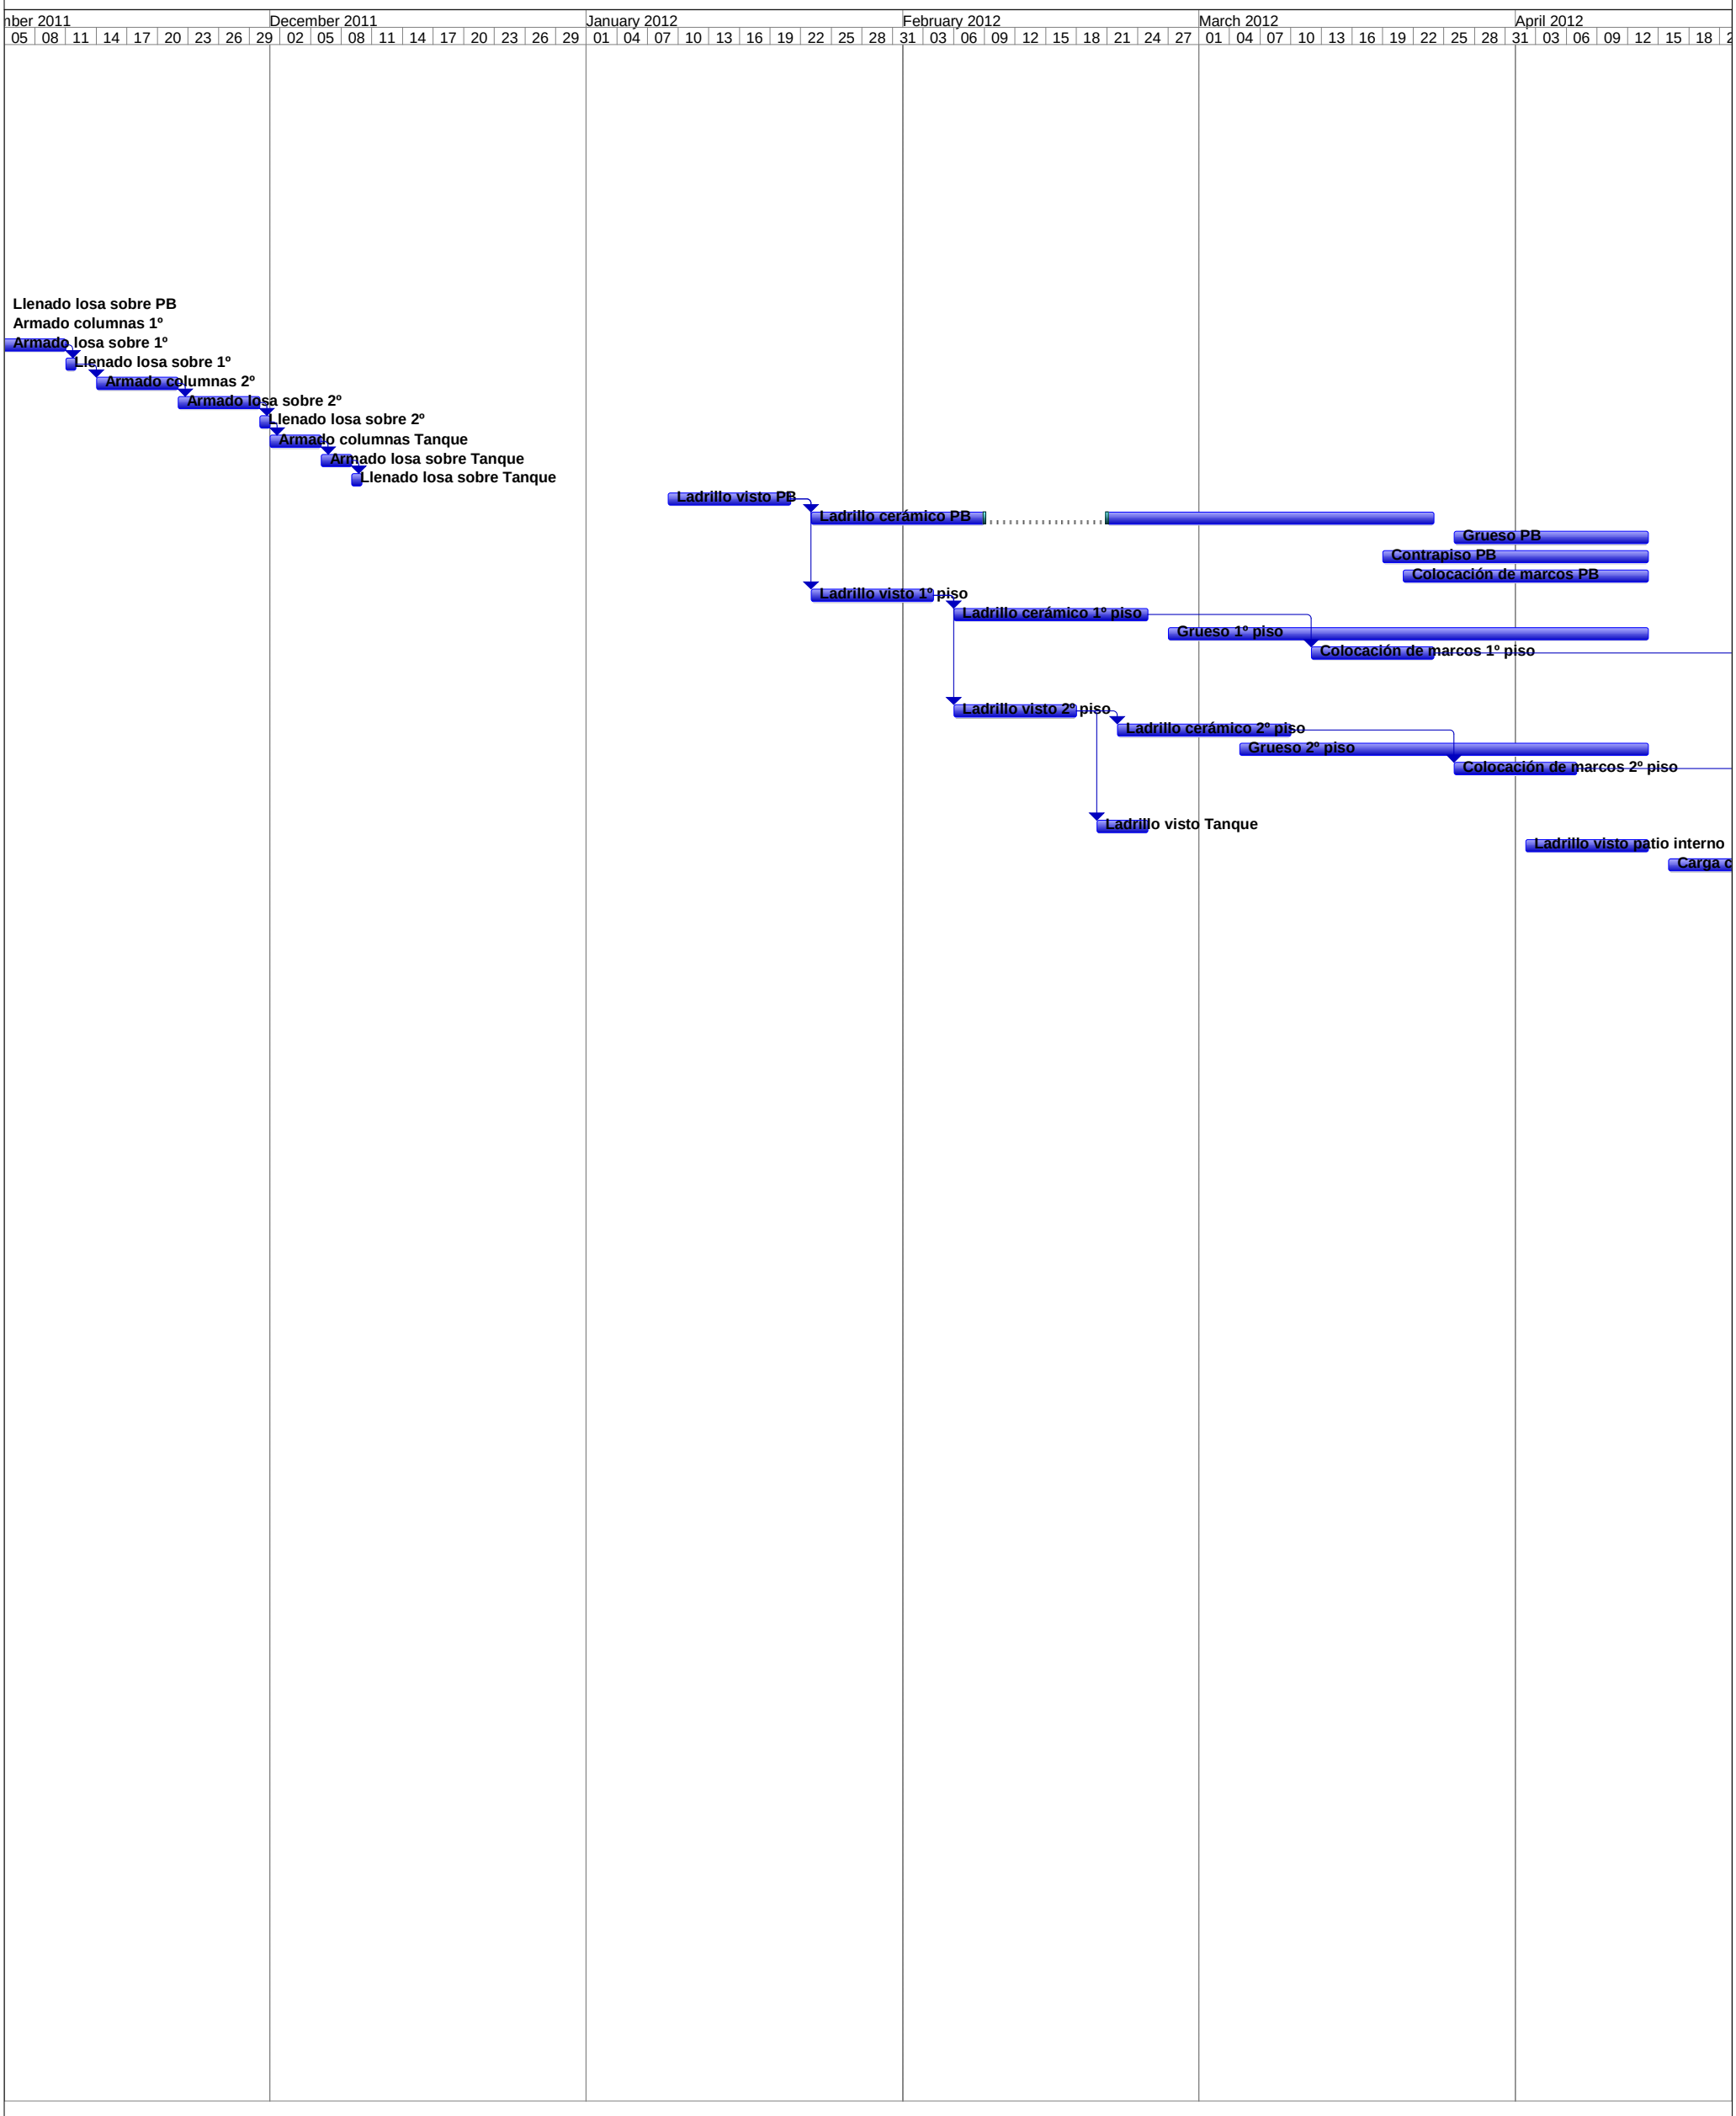
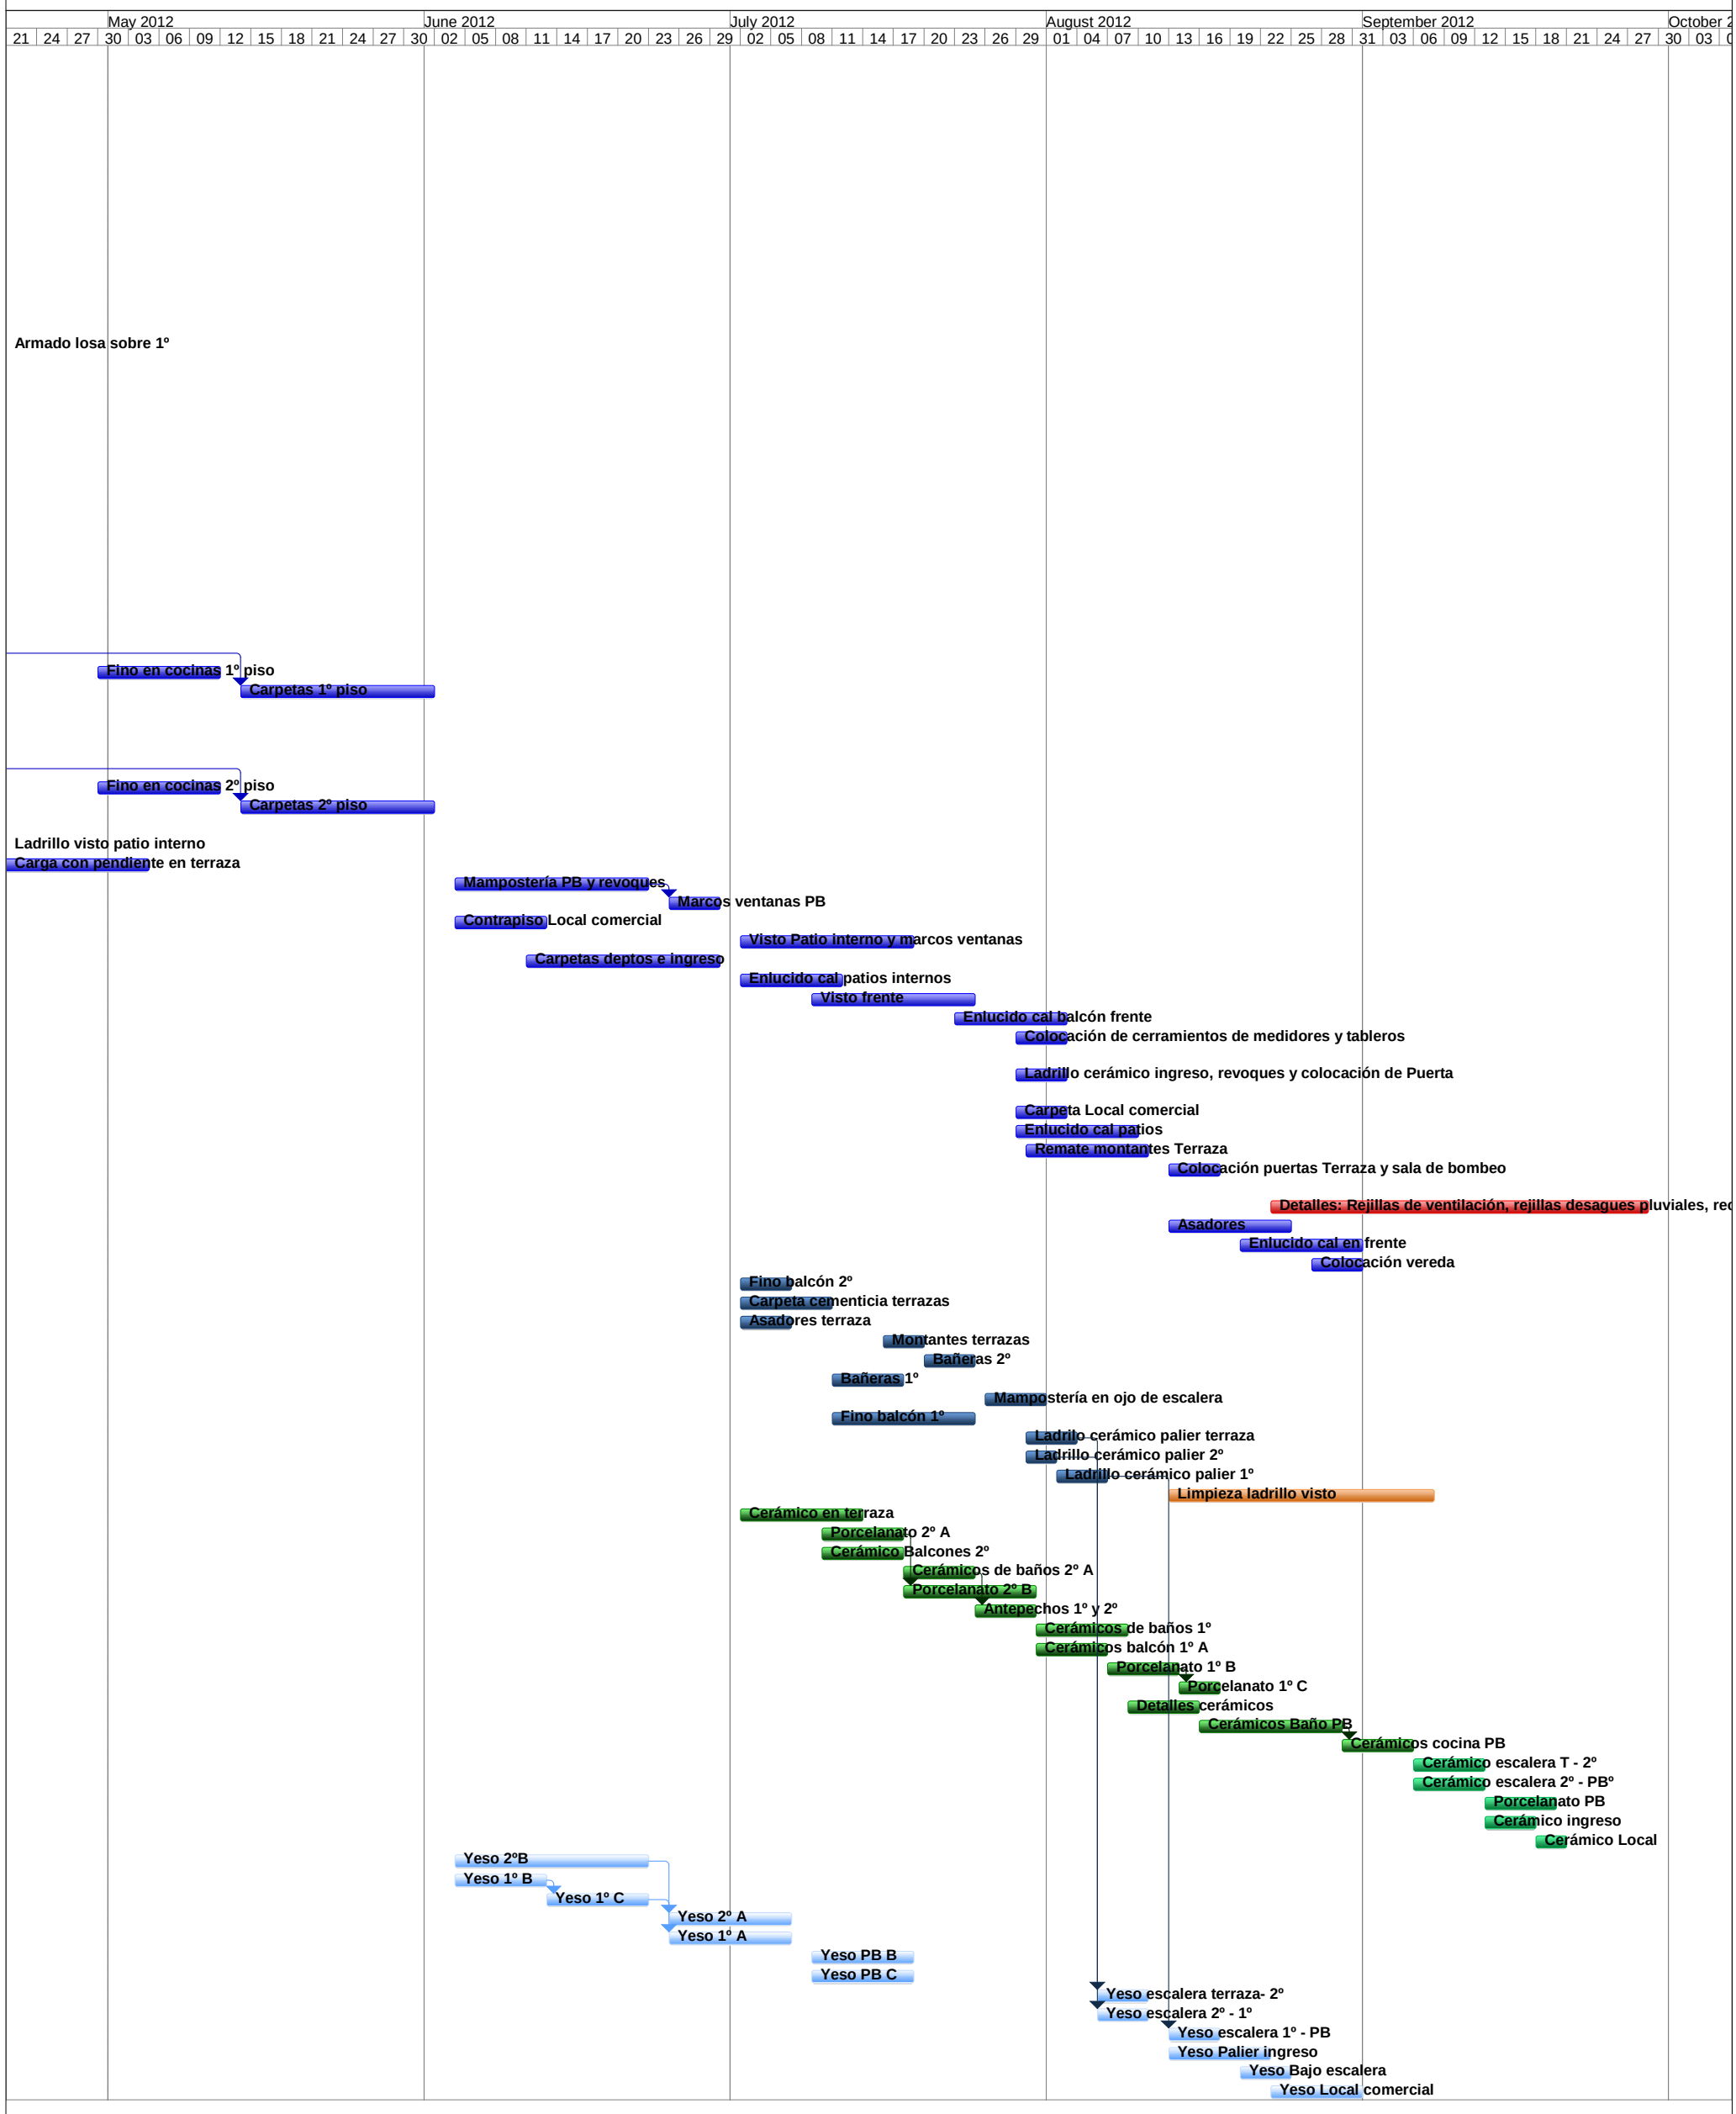
GANTT TEÓRICO - PROYECTO COMPLETO
